


Auftrag

- **Erstellung technischer Prototyp** zwecks Validierung der eKARUS-Konzepte
- Technische **Umsetzung zweier Prozess-Schritte** gemäss Fachkonzept
 - Deckungsanfrage und Deckungsantwort
 - Eintrittsmeldung
- **Durchführung** mit ausgewählten Spitälern und Versicherern

| Spitäler | Versicherer |
|---|--|
|  |  |
|  |  |

- Weitere Themen:
 - Standardisierungsprozesses
 - Fertigstellung und Abnahme der Konzepte
 - Planung des Pilotbetriebes und Evaluation von Partnern für den Pilotbetrieb

Vorgehensplanung

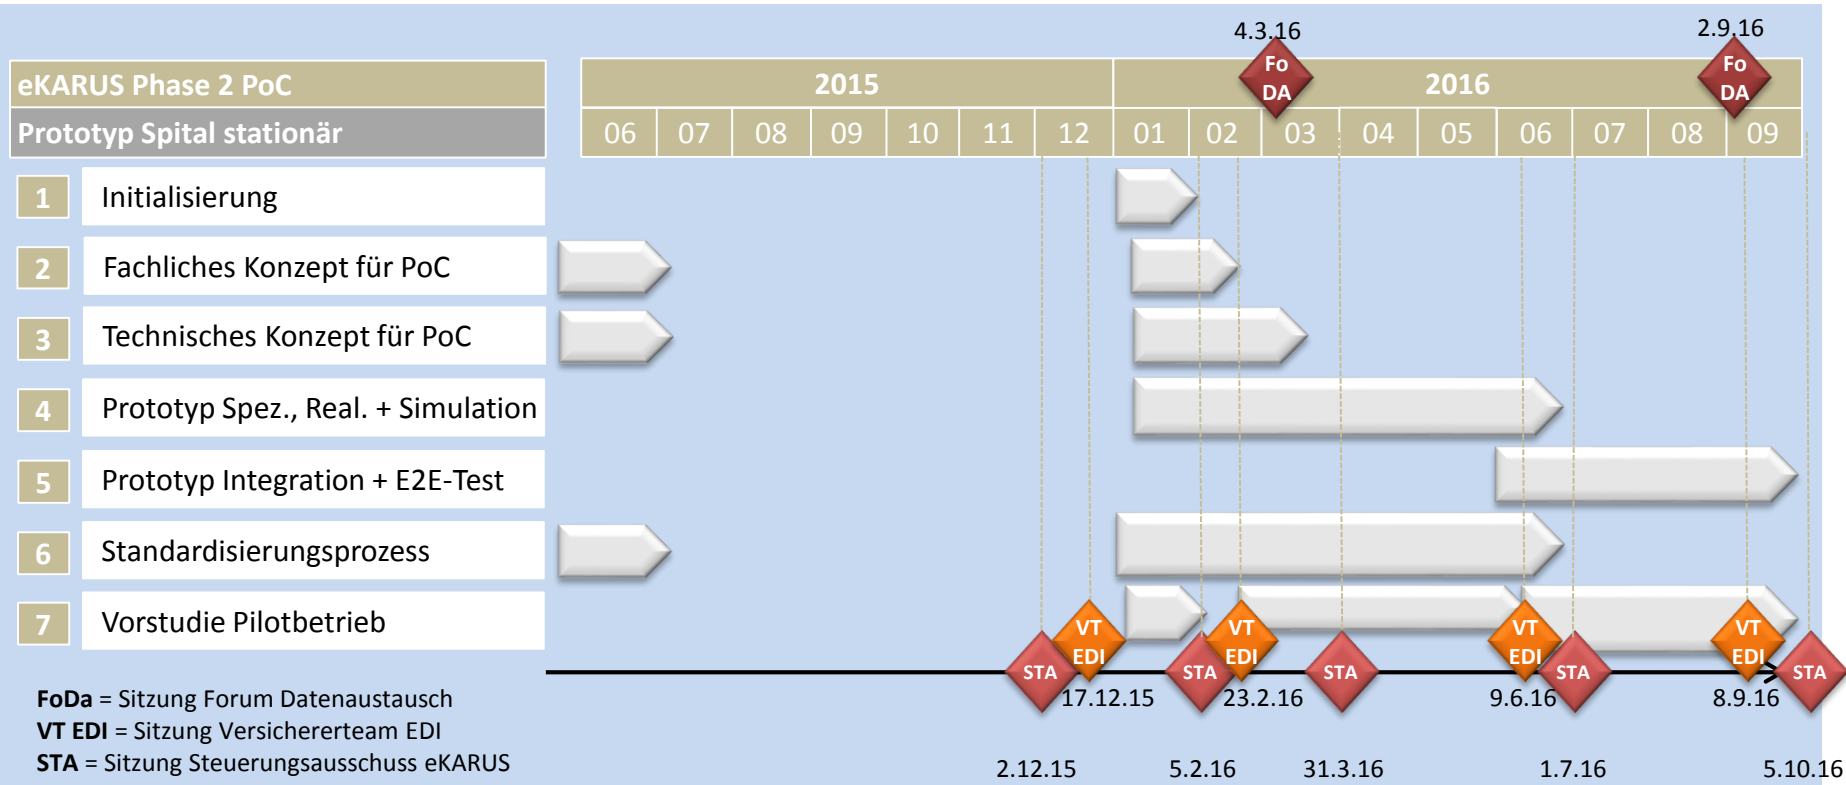

Geplante Ergebnisse

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 1 | 03.01.2016 – 05.02.2016 | Initialisierung abgeschlossen, Abnahme Detailplanung durch STA erfolgt |
| 2 | 12.03.2015 – 23.02.2016 | Finale Version des fachlichen Konzepts für PoC erstellt, Abnahme durch VT edi erfolgt |
| 3 | 12.03.2015 – 31.03.2016 | Finale Version des technischen Konzepts für PoC erstellt, Abnahme durch STA erfolgt |
| 4 | 15.01.2016 – 01.07.2016 | Prototyp mit Integrations-Mock-up's erstellt, getestet und dem STA präsentiert (Simulation) |
| 5 | 01.06.2016 – 05.10.2016 | Prototyp bei LE und KT integriert und End-2-End getestet, Abnahme Testbericht durch STA erfolgt |
| 6 | 12.03.2015 – 01.07.2016 | Prozess zur Standardisierung des Meldeverfahrens definiert und vom STA abgenommen |
| 7 | 15.01.2016 – 05.10.2016 | Vorstudie Pilotbetrieb |

Meilensteine / Lieferobjekte



eKARUS Phase 2 PoC

| Milestones | | Termine |
|------------|---|----------|
| M1 | Finale Version der Detailplanung mit bestätigten Mitwirkungen aller Partner | 31.01.16 |
| M2 | Finale Version fachliches Konzept für PoC | 15.02.16 |
| M3 | Finale Version technisches Konzept für PoC | 15.03.16 |
| M4 | Finale Version technische Spezifikation des Prototypen | 15.03.16 |
| M5 | Abschluss Realisierung des Prototypen | 31.05.16 |
| M6 | Erfolgreiche Simulation des Prototypen (mit Schnittstellen Mock-ups) | 30.06.16 |
| M7 | Abschluss Integration des Prototypen bei LE & KT | 15.08.16 |
| M8 | Erfolgreicher End-to-End Testlauf bei LE & KT | 30.09.16 |
| M9 | Finale Version Auslegeordnung und Varianten-Analyse zu Standardisierungsprozess | 15.03.16 |
| M10 | Finale Version des Standardisierungsprozess-Konzepts | 30.06.16 |
| M11 | Finale Version Phasenabschlussbericht mit offenen Punkten/Fragen | 30.09.16 |
| M12 | Finale Version Planung für Phase 3 & 4 (Pilotbetrieb) | 30.09.16 |
| M13 | Finale Version fachliches Konzept für Pilotbetrieb | 30.06.16 |
| M14 | Finale Version technisches Konzept für Pilotbetrieb | 30.09.16 |
